




Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021			
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	
1	ÉKMO2 Projekt várható ütemezése	1096 nap	Sze 17.12.06.	Szo 20.12.05.	1096 nap															
2	ÉKMO2 projekt lebonyolítás ütemezése		K 17.12.12.	Szo 20.12.05.	39%															
3	Munkaterület átadás tervezési munkákra	1 nap	K 17.12.12.	K 17.12.12.	1 nap															
4	Tervezési munkák	395 nap	Sze 17.12.13.	Cs 19.06.27.	76%															
5	Hálózat	395 nap	Sze 17.12.13.	Cs 19.06.27.	90%															
6	Jánd	67 nap	K 18.01.23.	Sze 18.05.02.	67 nap															
7	Aranyosapáti	79 nap	Sze 18.01.17.	H 18.05.14.	79 nap															
8	Mándok	350 nap	H 18.02.12.	Cs 19.06.27.	350 nap															
9	Gávavencsellő	165 nap	Sze 17.12.13.	Sze 18.08.08.	165 nap															
10	Tiszatelek	220 nap	Sze 17.12.13.	P 18.10.26.	220 nap															
11	Beszterec	187 nap	Sze 17.12.13.	H 18.09.10.	187 nap															
12	Újdombrád	181 nap	Sze 17.12.13.	P 18.08.31.	181 nap															
13	Telep	364 nap	K 18.01.23.	K 19.06.25.	63%															
14	Cigánd	250 nap	K 18.07.10.	K 19.06.25.	250 nap															
15	Vásárosnamény-Gergelyiugornya	188 nap	Cs 18.03.08.	Cs 18.12.06.	188 nap															
16	Aranyosapáti	225 nap	P 18.01.26.	Sze 18.12.19.	225 nap															
17	Mándok	101 nap	K 18.05.29.	H 18.10.29.	101 nap															
18	Gávavencsellő	185 nap	Sze 18.01.31.	H 18.10.29.	185 nap															
19	Tiszatelek	270 nap	K 18.01.23.	Cs 19.02.14.	270 nap															
20	Kiviteli tervek jóváhagyása	315 nap	Sze 18.05.09.	Cs 19.07.25.	42%															
21	Hálózat	315 nap	Sze 18.05.09.	Cs 19.07.25.	59%															
22	Jánd	3 nap	Sze 18.05.09.	P 18.05.11.	3 nap															
23	Aranyosapáti	4 nap	K 18.05.15.	P 18.05.18.	4 nap															
24	Mándok	10 nap	P 19.07.12.	Cs 19.07.25.	10 nap															
25	Gávavencsellő	1 nap	P 18.08.03.	K 18.08.07.	1 nap															
26	Tiszatelek	5 nap	H 18.12.10.	P 18.12.14.	5 nap															
27	Beszterec	10 nap	K 18.09.11.	P 18.09.21.	10 nap															
28	Újdombrád	10 nap	H 18.09.03.	P 18.09.14.	10 nap															
29	Telep	190 nap	K 18.10.16.	K 19.07.09.	29%															
30	Cigánd	10 nap	Sze 19.06.26.	K 19.07.09.	10 nap															
31	Vásárosnamény-Gergelyiugornya	10 nap	P 18.12.14.	Sze 18.12.26.	10 nap															
32	Aranyosapáti	10 nap	Cs 18.12.20.	Sze 19.01.02.	10 nap															
33	Mándok	8 nap	K 18.10.16.	H 18.10.29.	8 nap															
34	Gávavencsellő	8 nap	K 18.10.16.	H 18.10.29.	8 nap															
35	Tiszatelek	10 nap	P 19.02.15.	Cs 19.02.28.	10 nap															
36	Munkaterület átadása	339 nap	Sze 18.03.14.	Sze 19.07.10.	92%															
37	Hálózat	212 nap	Sze 18.03.14.	H 19.01.14.	100%															
38	Jánd	1 nap	Sze 18.03.14.	Sze 18.03.14.	1 nap															
39	Aranyosapáti	1 nap	Sze 18.03.14.	Sze 18.03.14.	1 nap															
40	Mándok	1 nap	H 19.01.14.	H 19.01.14.	1 nap															



Műszaki és tervezési ütemterv


Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021			
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1
41	Gávavencsellő	1 nap	Cs 18.06.07.	Cs 18.06.07.																
42	Tiszatelek	1 nap	K 18.10.16.	K 18.10.16.																
43	Beszterec	1 nap	H 18.09.10.	H 18.09.10.																
44	Újdombrád	1 nap	H 18.09.10.	H 18.09.10.																
45	Telep	185 nap	P 18.10.26.	Sze 19.07.10.																
46	Cigánd	1 nap	Sze 19.07.10.	Sze 19.07.10.																
47	Vásárosnamény-Gergelyiugornya	1 nap	K 18.11.13.	K 18.11.13.																
48	Aranyosapáti	1 nap	K 18.11.13.	K 18.11.13.																
49	Mándok	1 nap	P 18.10.26.	P 18.10.26.																
50	Gávavencsellő	1 nap	K 18.12.11.	K 18.12.11.																
51	Tiszatelek	1 nap	H 18.11.19.	H 18.11.19.																
52	Kivitelezési munkák elkezdése	625 nap	H 18.06.04.	H 20.10.26.																
53	Jánd - Vásárosnamény	617 nap	H 18.06.04.	Sze 20.10.14.																
54	Hálózat ideiglenes helyreállítással	518 nap	H 18.06.04.	Cs 20.05.28.																
55	Gravitációs vezeték	194 nap	H 18.06.04.	P 19.03.01.																
56	1-0-0 - Petőfi, Árpád u.	47 nap	H 18.06.04.	K 18.08.07.																
57	1-1-0 - Árpád, Rákóczi u.	30 nap	P 18.08.10.	Cs 18.09.20.																
58	1-1-1 - Rákóczi u.	3 nap	K 18.09.11.	Cs 18.09.13.																
59	1-2-0 - Ady Endre u.	3 nap	P 18.08.03.	K 18.08.07.																
60	2-0-0 - Kossuth, Szabadság, Arany u.	56 nap	K 18.07.10.	K 18.09.25.																
61	2-1-0 - Jókai u.	7 nap	H 18.11.12.	K 18.11.20.																
62	2-2-0 - Jókai, Béke u.	19 nap	K 18.11.13.	P 18.12.07.																
63	2-2-1 - Dózsa, Béke	59 nap	H 18.12.10.	Cs 19.02.28.																
64	2-2-1-1 - Béke u.	7 nap	P 18.11.30.	H 18.12.10.																
65	2-2-2 - Jókai u	3 nap	P 18.09.28.	K 18.10.02.																
66	2-3-0 - 289 hrsz u.	24 nap	Sze 18.10.03.	P 18.11.09.																
67	2-4-0 - Kossuth u.	17 nap	H 18.07.09.	K 18.07.31.																
68	2-5-0 - Arany J u.	4 nap	K 18.09.04.	P 18.09.07.																
69	2-6-0 - Arany, Jókai u.	7 nap	P 18.08.24.	H 18.09.03.																
70	3-0-0 - Rákóczi, Tisza, Hunyadi u.	105 nap	K 18.10.02.	P 19.03.01.																
71	3-1-0 - Rákóczi u.	9 nap	P 18.10.26.	P 18.11.09.																
72	3-2-0 - Rákóczi u.	6 nap	Cs 18.10.04.	Cs 18.10.11.																
73	3-3-0 - Bajcsi Zs.u.	12 nap	H 19.02.11.	K 19.02.26.																
74	3-4-0 - Tisza u.	10 nap	Cs 18.12.06.	Sze 18.12.19.																
75	Nyomó vezeték	227 nap	K 18.06.05.	Cs 19.04.18.																
76	NY-1 - Arpad, Petőfi u., külterület.	225 nap	K 18.06.05.	Cs 19.04.18.																
77	NY-2 - Jókai u.	7 nap	Cs 18.10.04.	P 18.10.12.																
78	NY-3 - Rákóczi u.	26 nap	H 18.10.01.	Sze 19.02.20.																
79	Végleges helyreállítás	50 nap	P 20.03.20.	Cs 20.05.28.																
80	Átemelő	64 nap	H 19.06.03.	Cs 19.08.29.																

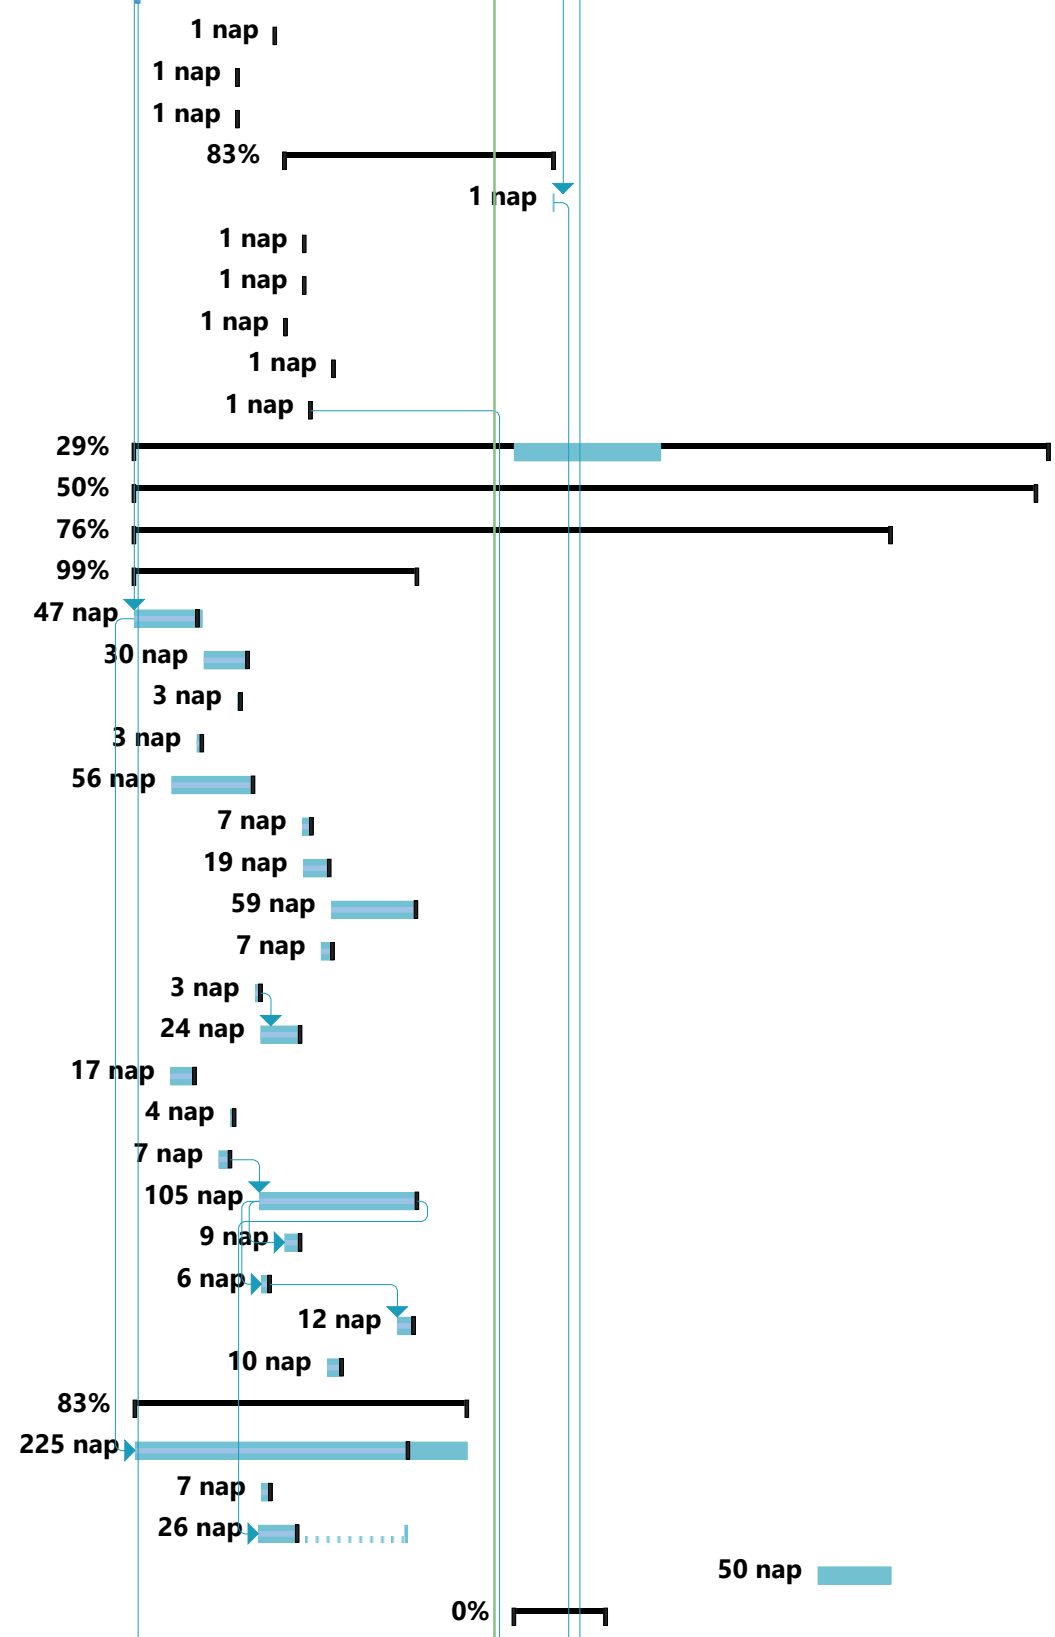



Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021			
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 4			
81	Á-1	44 nap	H 19.06.03.	Cs 19.08.01.																
82	Építészeti munkák	14 nap	H 19.06.03.	Cs 19.06.20.																
83	Gépészeti munkák	10 nap	P 19.06.21.	Cs 19.07.04.																
84	Elektromos és irányítástechnikai munkák	10 nap	P 19.07.19.	Cs 19.08.01.																
85	Á-2	54 nap	H 19.06.03.	Cs 19.08.15.																
86	Építészeti munkák	14 nap	H 19.06.03.	Cs 19.06.20.																
87	Gépészeti munkák	10 nap	P 19.07.05.	Cs 19.07.18.																
88	Elektromos és irányítástechnikai munkák	10 nap	P 19.08.02.	Cs 19.08.15.																
89	Á-3	64 nap	H 19.06.03.	Cs 19.08.29.																
90	Építészeti munkák	14 nap	H 19.06.03.	Cs 19.06.20.																
91	Gépészeti munkák	10 nap	P 19.06.21.	Cs 19.07.04.																
92	Elektromos és irányítástechnikai munkák	10 nap	P 19.08.16.	Cs 19.08.29.																
93	Telep	368 nap	H 19.05.20.	Sze 20.10.14.																
94	Kivitelezési munkák	240 nap	H 19.05.20.	P 20.04.17.																
95	Bontás	20 nap	H 20.08.10.	P 20.09.04.																
96	Próbaüzem	180 nap	Szo 20.04.18.	Sze 20.10.14.																
97	Aranyosapáti	616 nap	K 18.06.12.	Sze 20.10.21.																
98	Hálózat ideiglenes helyreállítással	523 nap	K 18.06.12.	P 20.06.12.																
99	Gravitációs vezeték	343 nap	K 18.06.12.	P 19.10.04.																
100	1-0-0 - Kossuth u.	80 nap	H 18.06.18.	P 18.10.05.																
101	1-1-0 - Kossuth u.	40 nap	H 19.06.03.	P 19.07.26.																
102	1-1-1 - Kossuth u.	30 nap	H 19.07.29.	P 19.09.06.																
103	1-2-0 - Bocskai u.	5 nap	P 18.08.24.	Cs 18.08.30.																
104	2-0-0 - Esze Tamás	52 nap	H 18.09.17.	Cs 18.11.29.																
105	2-1-0 - Vasút u.	40 nap	H 19.06.03.	P 19.07.26.																
106	2-1-1 - Vasút u.	30 nap	H 19.06.03.	P 19.07.12.																
107	2-1-2 - Bercsényi u.	30 nap	H 19.07.15.	P 19.08.23.																
108	2-1-3 - Hunyadi u.	30 nap	H 19.08.26.	P 19.10.04.																
109	2-1-3-1 - Vasút u.	30 nap	Cs 19.06.20.	Sze 19.07.31.																
110	2-2-0 - Kossuth u.	30 nap	Cs 19.08.01.	Sze 19.09.11.																
111	2-3-0 - Petőfi u.	30 nap	Sze 19.05.08.	K 19.06.18.																
112	2-3-1 - Petőfi u.	30 nap	Sze 19.06.19.	K 19.07.30.																
113	2-4-0 - Bajcsi Zs.	30 nap	Sze 19.07.31.	K 19.09.10.																
114	3-0-0 - Honvéd u.	280 nap	K 18.06.12.	K 19.07.09.																
115	3-1-0 - Béke u.	2 nap	P 18.06.22.	H 18.06.25.																
116	3-2-0 - Lenin u.	30 nap	H 19.02.11.	P 19.03.22.																
117	4-0-0 - Petőfi u., József A.	27 nap	K 18.10.09.	K 18.11.20.																
118	4-1-0 - József A.u.	50 nap	Cs 19.05.02.	Sze 19.07.10.																
119	4-2-0 - József, Arany u.	70 nap	H 18.09.03.	Sze 18.12.12.																
120	4-2-1 - Arany J. u.	4 nap	Cs 18.06.21.	K 18.06.26.																

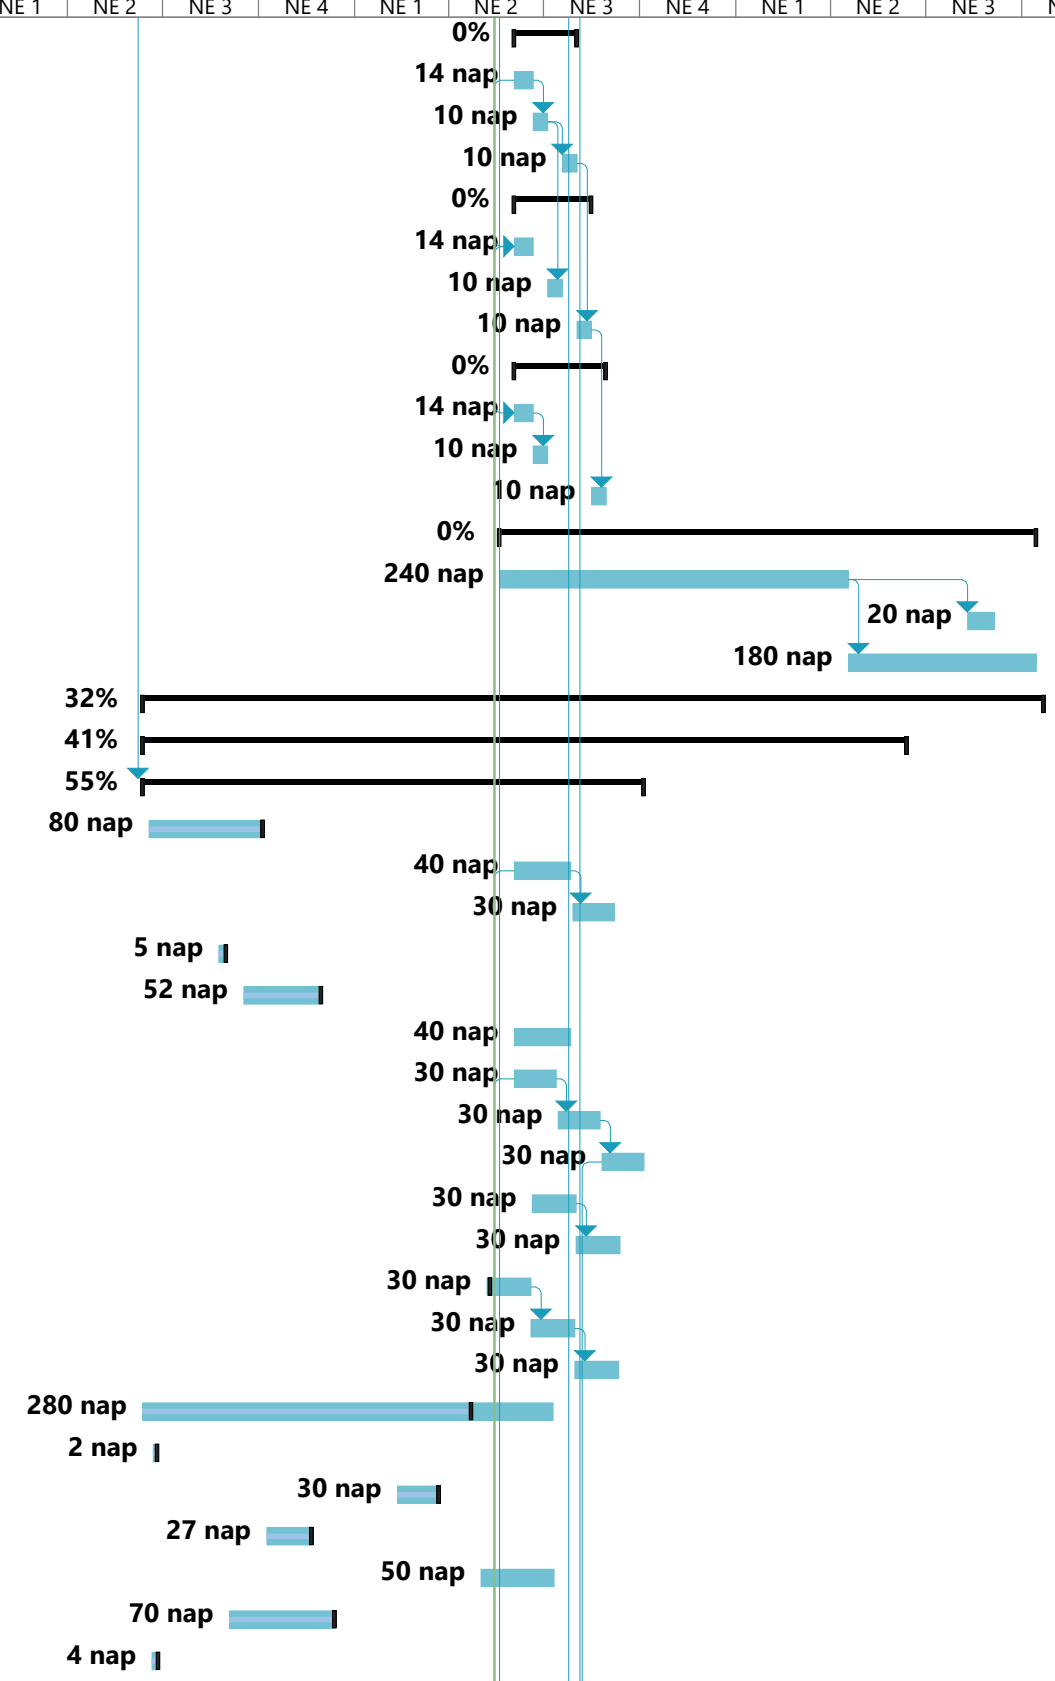



Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021		
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1			
121	4-2-2 - Kölcsey u.	4 nap	H 18.09.17.	Cs 18.09.20.					4 nap										
122	4-3-0 - Temető u.	10 nap	H 19.04.08.	P 19.04.19.						10 nap									
123	4-4-0 - Táncsics	27 nap	H 19.02.18.	K 19.03.26.						27 nap									
124	4-5-0 - Jókai u.	10 nap	K 19.03.26.	H 19.04.08.						10 nap									
125	Nyomó vezeték	248 nap	K 18.10.09.	P 19.09.20.						32%									
126	NY-1 - Kossuth u.	50 nap	H 19.06.03.	P 19.08.09.						50 nap									
127	NY-2 - Vasút u.	20 nap	H 19.06.03.	P 19.06.28.						20 nap									
128	NY-3 - Vasút u.	20 nap	H 19.08.26.	P 19.09.20.						20 nap									
129	NY-4 - József A. u.	45 nap	K 18.10.09.	Cs 18.12.13.						45 nap									
130	Végleges helyreállítás	60 nap	H 20.03.23.	P 20.06.12.															
131	Átemelő	85 nap	H 19.06.03.	P 19.09.27.						0%									
132	Á-1	60 nap	H 19.06.03.	P 19.08.23.						0%									
133	Építészeti munkák	20 nap	H 19.06.03.	P 19.06.28.						20 nap									
134	Gépészeti munkák	20 nap	H 19.07.01.	P 19.07.26.						20 nap									
135	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	H 19.07.29.	P 19.08.23.						20 nap									
136	Á-2	60 nap	H 19.06.10.	P 19.08.30.						0%									
137	Építészeti munkák	20 nap	H 19.06.10.	P 19.07.05.						20 nap									
138	Gépészeti munkák	20 nap	H 19.07.08.	P 19.08.02.						20 nap									
139	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	H 19.08.05.	P 19.08.30.						20 nap									
140	Á-3	60 nap	H 19.07.08.	P 19.09.27.						0%									
141	Építészeti munkák	20 nap	H 19.07.08.	P 19.08.02.						20 nap									
142	Gépészeti munkák	20 nap	H 19.08.05.	P 19.08.30.						20 nap									
143	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	H 19.09.02.	P 19.09.27.						20 nap									
144	Á-4	60 nap	H 19.06.17.	P 19.09.06.						0%									
145	Építészeti munkák	20 nap	H 19.06.17.	P 19.07.12.						20 nap									
146	Gépészeti munkák	20 nap	H 19.07.15.	P 19.08.09.						20 nap									
147	Elektromos és irányítástechnikai munkák	20 nap	H 19.08.12.	P 19.09.06.						20 nap									
148	Telep	383 nap	H 19.05.06.	Sze 20.10.21.						0%									
149	Kivitelezési munkák	255 nap	H 19.05.06.	P 20.04.24.						255 nap									
150	Próbaüzem	180 nap	Szo 20.04.25.	Sze 20.10.21.						180 nap									
151	Mándok	359 nap	H 19.06.03.	Cs 20.10.15.						0%									
152	<u>Hálózat ideiglenes helyreállítással</u>	320 nap	P 19.07.26.	Cs 20.10.15.						320 nap									
153	Telep	100 nap	H 19.06.03.	V 19.10.20.						0%									
154	Kivitelezési munkák	140 nap	H 19.06.03.	V 19.10.20.						140 nap									
155	Gávavencsellő	597 nap	H 18.07.02.	Sze 20.10.14.						17%									
156	<u>Hálózat ideiglenes helyreállítással</u>	509 nap	H 18.07.02.	P 20.06.12.						39%									
157	I. ütem	125 nap	H 18.07.02.	H 18.12.24.						100%									
158	M-1-0-0 Kolozsvári u.	13 nap	Cs 18.07.12.	H 18.07.30.						13 nap									
159	M-1-1-0 Kolozsvári u.	4 nap	Cs 18.07.19.	K 18.07.24.						4 nap									
160	M-2-0-0 Kolozsvári u.	13 nap	K 18.07.24.	Cs 18.08.09.						13 nap									



Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021		
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4
161	M-2-1-0 Árpád u.	6 nap	Sze 18.08.01.	Sze 18.08.08.					6 nap										
162	M-3-0-0 Vasút u.	10 nap	Cs 18.08.09.	Cs 18.08.23.					10 nap										
163	M-5-0-0 Temető u.	17 nap	Cs 18.08.30.	P 18.09.21.					17 nap										
164	M-5-1-0 Rakevszki u.	9 nap	P 18.08.31.	Sze 18.09.12.					9 nap										
165	M-6-0-0 Bem József, Kossuth Lajos u.	21 nap	H 18.10.01.	Sze 18.10.31.					21 nap										
166	M-6-1-0 Lehel u.	15 nap	K 18.10.02.	Sze 18.10.24.					15 nap										
167	M-8-0-0 József Attila, Kossuth Lajos u.	25 nap	Cs 18.11.15.	Sze 18.12.19.					25 nap										
168	M-8-1-0 Kossuth Lajos u.	3 nap	Cs 18.12.20.	H 18.12.24.					3 nap										
169	M-9-0-0 Vörösmarty Mihály u.	12 nap	K 18.07.03.	Sze 18.07.18.					12 nap										
170	M-9-1-0 Gorkij u.	18 nap	P 18.07.06.	K 18.07.31.					18 nap										
171	M-10-0-0 Jókai Mór, Akácfa u.	12 nap	H 18.07.02.	K 18.07.17.					12 nap										
172	M-10-1-0 Jókai Mór u.	2 nap	Cs 18.07.05.	P 18.07.06.					2 nap										
173	M-11-0-0 Uzsoki u.	13 nap	Cs 18.08.09.	K 18.08.28.					13 nap										
174	M-12-0-0 Rakevszki u., Kis köz	16 nap	Cs 18.08.23.	Cs 18.09.13.					16 nap										
175	M-12-1-0 Rakevszki u.	3 nap	P 18.09.28.	K 18.10.02.					3 nap										
176	II. ütem	346 nap	P 19.02.15.	P 20.06.12.															
177	Gravitációs vezeték	151 nap	P 19.02.15.	P 19.09.13.															
178	1-0-0 Vasvári Pál u.	20 nap	Cs 19.05.09.	Sze 19.06.05.					20 nap										
179	1-0-0 Halász u.	15 nap	Cs 19.05.09.	Sze 19.05.29.					15 nap										
180	1-1-0 Vasvári Pál u.	8 nap	Cs 19.05.09.	H 19.05.20.					8 nap										
181	1-1-0 Toldi Miklós u.	5 nap	Cs 19.05.02.	Sze 19.05.08.					5 nap										
182	1-1-1 Toldi Miklós u.	5 nap	Cs 19.05.02.	Sze 19.05.08.					5 nap										
183	1-1-2 Arany János u.	5 nap	Sze 19.04.17.	K 19.04.23.					5 nap										
184	1-2-0 Halász u.	7 nap	Cs 19.05.09.	P 19.05.17.					7 nap										
185	2-0-0 Rákóczi Ferenc u.	4 nap	H 19.05.20.	Cs 19.05.23.					4 nap										
186	2-0-0 Arany János u.	8 nap	P 19.05.24.	K 19.06.04.					8 nap										
187	2-1-0 Rákóczi Ferenc u.	3 nap	Sze 19.06.05.	P 19.06.07.					3 nap										
188	3-0-0 Fertő u.	16 nap	Sze 19.03.20.	Sze 19.04.10.					16 nap										
189	3-1-0 Fertő u.	3 nap	H 19.04.15.	Sze 19.04.17.					3 nap										
190	3-1-0 Kossuth u.	2 nap	K 19.04.23.	Cs 19.04.25.					2 nap										
191	4-0-0 Kossuth u.	6 nap	K 19.03.19.	K 19.03.26.					6 nap										
192	4-1-0 Kossuth u.	9 nap	Sze 19.03.06.	H 19.03.18.					9 nap										
193	M-4-0-0 Báthori u.	1 nap	P 19.05.24.	P 19.05.24.					1 nap										
194	M-4-0-0 Arany János u.	18 nap	H 19.05.27.	Sze 19.06.19.					18 nap										
195	M-4-1-0 Báthory u.	3 nap	Cs 19.06.20.	H 19.06.24.					3 nap										
196	5-0-0 Bem József u.	14 nap	H 19.03.18.	Cs 19.04.04.					14 nap										
197	5-1-0 Bem József u.	8 nap	Cs 19.03.07.	H 19.03.18.					8 nap										
198	6-0-0 Major u.	3 nap	P 19.03.15.	K 19.03.19.					3 nap										
199	6-0-0 Lehel u.	12 nap	Sze 19.02.27.	Cs 19.03.14.					12 nap										
200	6-1-0 Major u.	13 nap	P 19.02.15.	K 19.03.05.					13 nap										




Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021			
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1
201	6-1-0 Ady Endre u.	15 nap	P 19.02.15.	Cs 19.03.07.					15 nap											
202	7-0-0 Tisza u.	4 nap	Cs 19.06.06.	K 19.06.11.					4 nap											
203	7-1-0 Tisza u.	3 nap	H 19.06.03.	Sze 19.06.05.					3 nap											
204	M-7/a-0-0 Petőfi Sándor u.	2 nap	Cs 19.06.06.	P 19.06.07.					2 nap											
205	8-0-0 Tisza u.	16 nap	Sze 19.06.26.	Sze 19.07.17.					16 nap											
206	8-1-0 Tisza u.	10 nap	Sze 19.06.12.	K 19.06.25.					10 nap											
207	8-2-0 Kovács Mihály u.	8 nap	Sze 19.06.26.	P 19.07.05.					8 nap											
208	9-0-0 Báthori u.	8 nap	Sze 19.09.04.	P 19.09.13.					8 nap											
209	9-0-0 Honvéd u.	6 nap	K 19.08.27.	K 19.09.03.					6 nap											
210	9-1-0 Báthori u.	4 nap	Sze 19.08.21.	H 19.08.26.					4 nap											
211	10-0-0 Báthori u.	14 nap	Cs 19.07.25.	K 19.08.13.					14 nap											
212	10-1-0 Báthori u.	5 nap	Sze 19.08.14.	K 19.08.20.					5 nap											
213	11-0-0 Lónyai u.	5 nap	Cs 19.07.18.	Sze 19.07.24.					5 nap											
214	11-1-0 Lónyai u.	0 nap	Sze 19.07.24.	Sze 19.07.24.																
215	12-0-0 Móricz Zsigmond u.	9 nap	K 19.06.11.	P 19.06.21.					9 nap											
216	13-0-0 Rakovszki u.	6 nap	H 19.06.03.	H 19.06.10.					6 nap											
217	Nyomó vezeték	131 nap	Sze 19.02.27.	Sze 19.08.28.					26%											
218	NY-1	15 nap	Cs 19.05.09.	Sze 19.05.29.					15 nap											
219	NY-2	6 nap	Cs 19.05.09.	Cs 19.05.16.					6 nap											
220	NY-3	15 nap	P 19.04.05.	Cs 19.04.25.					15 nap											
221	NY-4	4 nap	K 19.03.19.	P 19.03.22.					4 nap											
222	NY-5	10 nap	H 19.03.18.	P 19.03.29.					10 nap											
223	NY-6	12 nap	Sze 19.02.27.	Cs 19.03.14.					12 nap											
224	NY-7	7 nap	H 19.06.03.	K 19.06.11.					7 nap											
225	NY-8	12 nap	Sze 19.06.26.	Cs 19.07.11.					12 nap											
226	NY-9	4 nap	Sze 19.08.21.	H 19.08.26.					4 nap											
227	NY-10	8 nap	Cs 19.07.25.	H 19.08.05.					8 nap											
228	NY-11	5 nap	Cs 19.07.25.	Sze 19.07.31.					5 nap											
229	NY-12	10 nap	K 19.06.11.	H 19.06.24.					10 nap											
230	NY-13	5 nap	H 19.06.03.	P 19.06.07.					5 nap											
231	NYG-1	50 nap	Cs 19.06.20.	Sze 19.08.28.					50 nap											
232	Átemelők	210 nap	H 19.06.10.	P 20.03.27.					210 nap											
233	Végleges helyreállítás	60 nap	H 20.03.23.	P 20.06.12.					60 nap											
234	Telep	405 nap	Cs 19.03.28.	Sze 20.10.14.					1%											
235	Szociális és kezelő épület építése	130 nap	Sze 19.04.03.	K 19.10.01.																
236	I. Reaktor építése	110 nap	Cs 19.03.28.	Sze 19.08.28.					110 nap											
237	II. Reaktor építése	110 nap	Cs 19.03.28.	Sze 19.08.28.					110 nap											
238	Utóülepítő medence építése	110 nap	Cs 19.03.28.	Sze 19.08.28.					110 nap											
239	Fertőtlenítő medence építése	45 nap	Cs 19.04.18.	Sze 19.06.19.					45 nap											
240	Izlapstabilizáló-sűrítő építése	45 nap	Cs 19.04.18.	Sze 19.06.19.					45 nap											



Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021					
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1		
241	Csurgalékvíz átemelő építése	20 nap	Cs 19.05.30.	Sze 19.06.26.																		
242	Tisztított szennyvíz átemelő építése	20 nap	Cs 19.05.30.	Sze 19.06.26.																		
243	Egyéb műtárgyak építése	60 nap	Cs 19.06.27.	Sze 19.09.18.																		
244	Vassó tároló, Vízmérőműtárgyak, Osztóakna 1-2, M	60 nap	Cs 19.06.27.	Sze 19.09.18.																		
245	Udvartéri vezetékek, közművek	45 nap	Cs 19.07.04.	Sze 19.09.04.																		
246	Technológiai gépészeti szerelés	90 nap	Cs 19.08.29.	Sze 20.01.01.																		
247	Elektromos erős-gyengeáram és irányítástechnikai sz	100 nap	Cs 19.09.05.	Sze 20.01.22.																		
248	Kerítés, térburkolat építés, csapadékvíz- tereprende	120 nap	Cs 19.09.26.	Sze 20.03.11.																		
249	Üzempróbák	10 nap	Cs 20.01.23.	Sze 20.02.05.																		
250	Próbaüzem	180 nap	Cs 20.02.06.	Sze 20.10.14.																		
251	Tiszatelek-Beszterec-Újdombrád	511 nap	P 18.11.02.	Sze 20.10.14.																		
252	Tiszatelek - Hálózat ideiglenes helyreállítással	382 nap	P 19.02.15.	H 20.08.03.																		
253	1-0-0 Kossuth u.	20 nap	Cs 19.08.15.	Sze 19.09.11.																		
254	1/1-0-0 Dózsa Gy.	20 nap	Cs 19.09.12.	Sze 19.10.09.																		
255	2-0-0 Kossuth u.	30 nap	P 19.05.10.	Cs 19.06.20.																		
256	2-1-0 Kossuth, Damjanich, Petőfi u.	10 nap	P 19.06.21.	Cs 19.07.04.																		
257	2-2-0 Damjanich J. u	7 nap	P 19.07.05.	H 19.07.15.																		
258	2-3-0 Petőfi u.	7 nap	K 19.07.16.	Sze 19.07.24.																		
259	3-0-0 Kossuth u.	30 nap	H 19.04.22.	P 19.05.31.																		
260	3-1-0 Kossuth u.	12 nap	P 19.05.03.	H 19.05.20.																		
261	3-2-0 Szántó-K. J. u	12 nap	K 19.05.21.	Sze 19.06.05.																		
262	4-0-0 Tanács, Zrínyi Ilona u,	30 nap	Cs 19.06.06.	Sze 19.07.17.																		
263	4-1-0 Zrínyi Ilona u,	6 nap	Cs 19.07.18.	Cs 19.07.25.																		
264	4-2-0 Tanács u.	8 nap	P 19.07.26.	K 19.08.06.																		
265	5-0-0 Kossuth u.	6 nap	Sze 19.08.07.	Sze 19.08.14.																		
266	7-0-0 Árpád, Fürst S. út	16 nap	Cs 19.08.15.	Cs 19.09.05.																		
267	7-1-0 Fürst S. út	4 nap	P 19.09.06.	Sze 19.09.11.																		
268	7-2-0 József A. u.	9 nap	Cs 19.09.12.	K 19.09.24.																		
269	7-3-0 Iskola u	10 nap	H 19.06.10.	P 19.06.21.																		
270	8-0-0 Arany J.u	15 nap	P 19.05.31.	Cs 19.06.20.																		
271	8-1-0 Árpád, Arany J.u	11 nap	P 19.06.21.	P 19.07.05.																		
272	8-1-1 Árpád u.	5 nap	K 19.07.16.	H 19.07.22.																		
273	9-0-0 Dózsa Gy.	30 nap	Cs 19.08.01.	Sze 19.09.11.																		
274	9-1-0 Dózsa Gy.	8 nap	Cs 19.08.15.	H 19.08.26.																		
275	10-0-0 Dózsa Gy.	8 nap	Sze 20.05.06.	P 20.05.15.																		
276	10-1-0 Dózsa Gy.	4 nap	Cs 19.07.11.	K 19.07.16.																		
277	11-0-0 Esze Tamás u.	3 nap	Sze 19.06.05.	P 19.06.07.																		
278	11-0-0 Sallai u.	9 nap	P 19.03.08.	Sze 19.03.20.																		
279	11-1-0 Esze Tamás u.	60 nap	Cs 19.03.21.	Cs 19.07.11.																		
280	11-2-0 Esze Tamás u.	60 nap	H 19.03.25.	H 19.07.15.																		

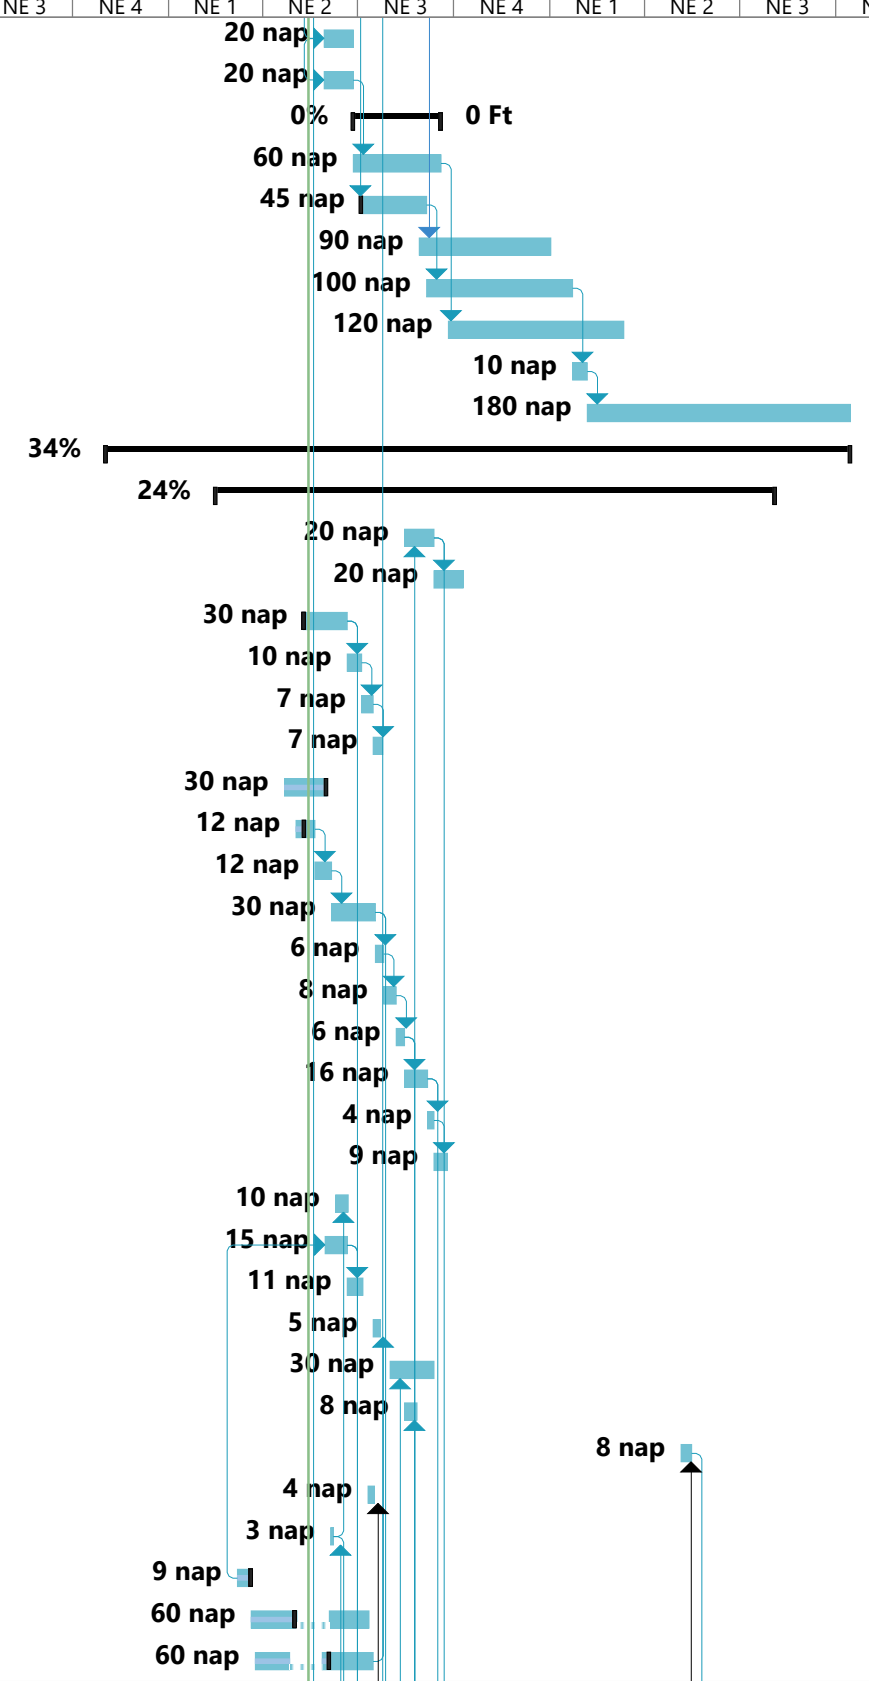



Műszaki és tervezési ütemterv

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	2018				2019				2020				2021		
					NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1	NÉ 2	NÉ 3	NÉ 4	NÉ 1			
281	12-0-0 Rákóczi u.	80 nap	H 19.03.11.	Sze 19.07.31.															
282	13-0-0 Ady E.u.	10 nap	Cs 19.08.01.	Sze 19.08.14.															
283	Nyomó vezeték	336 nap	P 19.02.15.	P 20.05.29.															
284	NY-1	1 nap	Cs 19.09.12.	Cs 19.09.12.															
285	NY-1/1	20 nap	P 19.09.13.	Cs 19.10.10.															
286	NY-2	40 nap	P 19.06.21.	Cs 19.08.15.															
287	NY-3	90 nap	Cs 19.04.04.	Sze 19.08.07.															
288	NY-4	30 nap	Cs 19.07.18.	Sze 19.08.28.															
289	NY-5	1 nap	Cs 19.08.15.	Cs 19.08.15.															
290	NY-6	3 nap	P 19.09.13.	K 19.09.17.															
291	NY-7	18 nap	P 19.09.06.	K 19.10.01.															
292	NY-8	18 nap	P 19.06.21.	K 19.07.16.															
293	NY-9	200 nap	P 19.02.15.	Cs 19.11.21.															
294	NY-10	10 nap	H 20.05.18.	P 20.05.29.															
295	NY-11	2 nap	H 19.06.10.	K 19.06.11.															
296	NY-12	1 nap	Cs 19.08.01.	Cs 19.08.01.															
297	NY-13	1 nap	Cs 19.08.15.	Cs 19.08.15.															
298	Végleges helyreállítás	50 nap	Sze 20.04.01.	K 20.06.09.															
299	Átemelő aknák	286 nap	H 19.07.01.	H 20.08.03.															
300	Á-1	22 nap	H 19.07.01.	K 19.07.30.															
301	Á-2	22 nap	Sze 19.07.31.	Cs 19.08.29.															
302	Á-3	22 nap	P 19.08.30.	H 19.09.30.															
303	Á-4	22 nap	K 19.10.01.	Sze 19.10.30.															
304	Á-5	22 nap	Cs 19.10.31.	P 19.11.29.															
305	Á-6	22 nap	H 19.12.02.	K 19.12.31.															
306	Á-7	22 nap	Sze 20.01.01.	Cs 20.01.30.															
307	Á-8	22 nap	P 20.01.31.	H 20.03.02.															
308	Á-9	22 nap	K 20.03.03.	Sze 20.04.01.															
309	Á-10	22 nap	Cs 20.04.02.	P 20.05.01.															
310	Á-11	22 nap	H 20.05.04.	K 20.06.02.															
311	Á-12	22 nap	Sze 20.06.03.	Cs 20.07.02.															
312	Á-13	22 nap	P 20.07.03.	H 20.08.03.															
313	Beszterec - Hálózat ideiglenes helyreállítással	374 nap	P 18.11.30.	K 20.05.05.															
314	Gravitációs vezeték	160 nap	P 18.11.30.	Sze 19.07.10.															
315	1-0-0 Kossuth u.	24 nap	Cs 19.05.02.	K 19.06.04.															
316	1-1-0 Árpád u.	30 nap	H 19.04.01.	P 19.05.10.															
317	1-2-0 Arany J.u	31 nap	H 19.02.11.	H 19.03.25.															
318	1-3-0 Kossuth u.	3 nap	H 19.06.03.	Sze 19.06.05.															
319	2-0-0 Petőfi S.	42 nap	Cs 19.05.02.	P 19.06.28.															
320	2-1-0 József A.u	54 nap	H 18.12.03.	Cs 19.02.14.															

